

第四章PMBOK7串讲-2：项目管理绩效域

- 4.2.1干系人绩效域

- 概念
 - 一组对有效地交付项目成果至关重要的相关活动
- 8个绩效域
 -



- 相互作用
- 相互依赖
- 相互关联
- 整体运作
- 没有权重

- 每个绩效域的结构

- 预期成果
- 名词定义
- 绩效域介绍
- 与其他绩效域的相互作用
- 检查结果

- 检查结果
- 绩效域介绍
- 新概念详细介绍
- 旧概念一带而过

- 干系人

成果	检查
富有成效的关系	1. 观察工作关系的成效 2. 干系人参与的主动性高低
干系人对目标同意	1. 范围需求是否有大量修改
支持的人满意 反对的人未产生消极影响	1. 调研、访谈、焦点小组 2. 问题、风险登记册的审查

- 4.2.2团队绩效域

- 成果

-

成果	检查
共享责任	1. 所有成员了解愿景和目标 2. 团队对项目成果承担全责
高绩效团队	1. 彼此信任、相互协作 2. 团队有韧性和适应性 3. 团队感到被赋能
所有成员展现出领导力和其他人际关系技能	1. 批判性思维和人际关系技能 2. 领导风格裁剪适应项目背景和环境

- 管理和领导力

- 区别

- 管理活动聚焦于实现项目目标的手段
 - 领导力关注于人

- 分类

- 集中式领导力
 - 项目经理终责
 - 项目章程
 - 分布式领导力
 - 自组织团队
 - 仆人型领导

- 共同方面

- 愿景和目标
 - 角色和职责
 - 项目团队运作

- 项目团队文化

- 内容

- 透明、诚信、尊重、积极地讨论、支持、勇气、庆祝成功

- 偏见

- 有意识和无意识，如甘特图。可通过透明化消除

- 对话而非辩论

- 辩论是输/赢，通过获胜而满足

- 庆祝成功

- 实时认可贡献，让团队保持被激励

- 高绩效团队

- 内容

- 开放式沟通、共识、共享责任、信任、协作、适应性、韧性、赋能、认可
- 共享责任
 - 主人翁意识
- 适应性
 - 团队根据项目环境调整工作方式
- 韧性
 - 出现问题时，项目团队可快速恢复
- 赋能（赋权）
 - 让团队成员有权就工作方式做出决策
- 领导力技能
 - 内容
 - 建立和维护愿景
 - 愿景
 - 项目愿景简明扼要地总结了项目的目的
 - 内容
 - 项目目的是什么
 - 项目工作成功的定义是什么
 - 交付成果如何改变未来
 - 如何知道偏离了愿景
 - 格式
 - 强有力的断句概括
 - 描述可实现的最佳成果
 - 脑海中形成共识画面
 - 激发人们对实现成果的热情
 - 批判性思维
 - 概念
 - 应用观察、分析、推论、语境、反思等过程以便达成判断
 - 反思性思维
 - 概念
 - 思考自己的思考，考虑和阐明一个人的自我体验的过程，最好用于将知识运用到将来的活动
 - 从经验中学习
 - 收尾的时候总结反思改进，使将来获益
 - 在经验中学习
 - 做事的过程中立即反思，实时学习改进
 - 元认识

- 概念
 - 认知的认知：我们审视自身思想的能力，是对自身的“思考过程”进行认知和理解
 - 元认知本质上也是反思的思维，反思的是我们的思考过程，元认知有全局性思维，让我们跳出来看待自己的思考
- 推理
 - 归纳推理
 - 归纳法：水管、电线、灯、燃气、五金件
 - 演绎推理
 - 三段论：人都会死，他是人，他会死
 - 溯因推理
 - 综合演绎和归纳法进行溯因验证的推理
- 谬误
 - 前提谬误
 - 项目以错误的需求为前提
 - 类比谬误
 - 项目用了之前失败的项目的人，所以这个项目会失败
 - 诉诸情感谬误
 - 每天加班到半夜，一定能把项目做好
- 激励
 - 目的
 - 了解成员绩效；
 - 让团队成员持续开展工作
 - 类别
 - 内在激励
 - 成就、挑战、信念.....
 - 外在激励
 - 奖金
- 人际关系技能
 - 情商
 - 概念
 - 识别自己和他人情绪的能力
 - 内容
 - 自我意识
 - 自我管理
 - 社交技能

- 社交意识

- 决策

- 概念

- 部分决策会对项目产生重大影响

-

决策类型	优点	缺点	举例
独裁型决策	快速	出错、影响积极性	单独决策
群体决策	准确、认同	耗时较长、工作中断	投票、表决
发散/汇聚模式	快速、准确	提前制定方案	罗马式表决（拇指投票）、宽带德尔菲、举手表决

上报：超出团队决策权的决策，需要制定备选方案并上报。

- 冲突管理

- 概念

- 解决冲突可能导致更多冲突，也可能导致更好的决策和出色的方案

- 项目经理职责

- 营造信任尊重的环境
 - 对事不对人
 - 看未来而非看过去
 - 一起寻找备选方案

- 裁剪领导风格

- 意义

- 对领导风格的裁剪，可以更好地满足项目、环境和干系人的需要

- 领导风格

- 符合特定项目经验
 - 团队成员成熟度
 - 组织治理结构
 - 分布式项目团队


- 4.2.3开发方法和生命周期绩效域

- 成果


-

成果	检查
与项目可交付物相符的开发方法	开发方法（预测、混合、适应型）反映了产品变量，也适用于项目和组织变量。
项目生命周期的阶段将业务交付与干系人价值联系起来	1. 从启动到收尾的项目工作以项目阶段表示 2. 阶段包括适当的退出标准。
1. 项目生命周期由阶段组成 2. 阶段由交付节奏和开发方法组成 3. 交付节奏和开发方法取决于可交付物性质	1. 开发、测试、部署的节奏以生命周期阶段表示 2. 用阶段重叠表示多个可交付物、交付节奏与开发方法

- 项目生命周期
 - 项目从开始到结束所经历的一系列阶段
- 项目生命周期和项目管理生命周期的关系

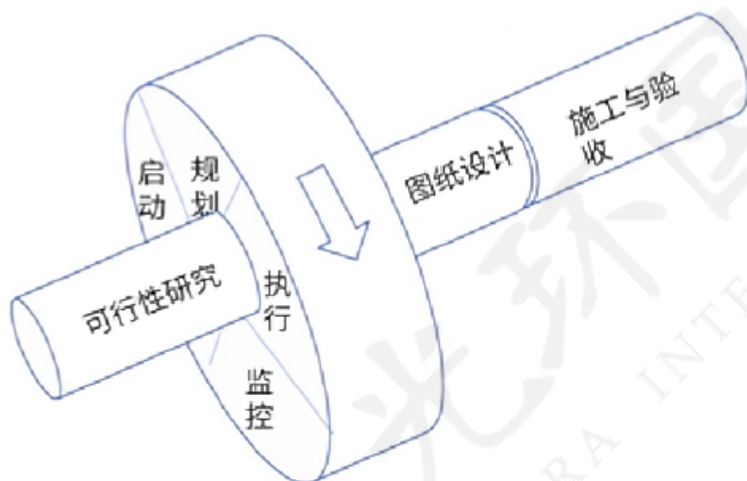

- 开发方法
 - 项目生命周期内开发产品的方法，如预测、迭代、增量、适应、混合
- 开发方法和项目生命周期的关系
- 开发方法与可交付物的关系

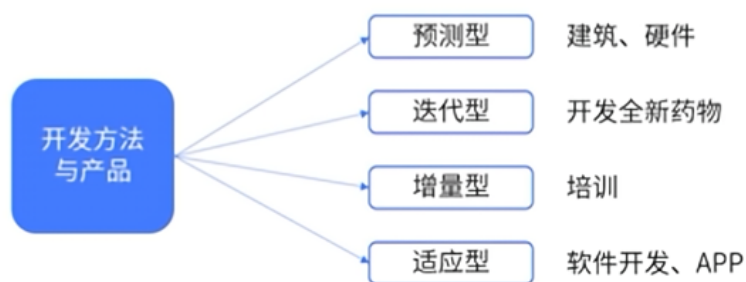

- 交付节奏
 - 概念
 - 在整个项目期间所开展活动的节律



4.2.4规划绩效域

成果

•

成果	检查
有条理地推进项目	项目按基准执行，绩效偏差在临界值内
有交付成果的整体规划	整体规划考虑全面（如进度、成本、资源、采购）
对不断演变的信息有详细说明，以生成可交付成果	1. 当前的可交付物的初步信息被详细阐述 2. 项目将产生符合商业论证的可交付物
规划的时间合理	项目计划和文件表明，规划水平适合与项目
规划的信息满足干系人期望	沟通管理计划和干系人信息表明足以满足期望
对变化有调整	1. 待办事项列表有调整 2. CCB的变更日志和文档表明变更有控制

内容

• 高层级规划

- 商业论证、项目章程、愿景陈述
- 除了考虑经济可行性外还要考虑三重底线

• 详细规划

- 范围、进度、成本、资源等

• 生命周期评估LCA


• 概念

- 用于评价产品、过程或系统的总体环境影响的工具

• 产品生命周期

- 产品从摇篮到坟墓整个生命周期中对环境的影响
- 评估框架

•

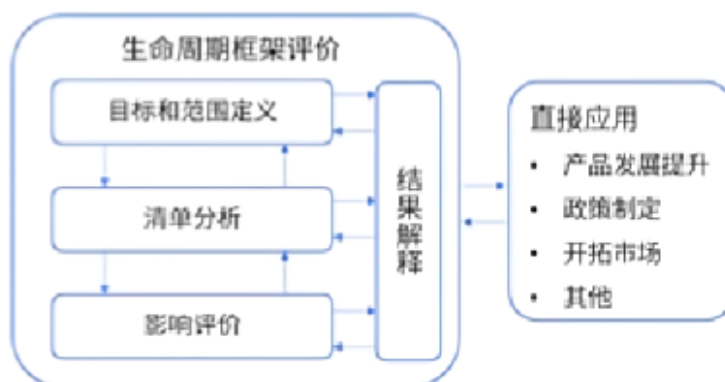

• 注意

- 规划的详细程度应该适度

- 内容

- 范围规划

-



- 估算



- 方法

-

估算展示方法	示例
确定性估算	3年
概率估算	36±2个月, 95%能在300万内成功
绝对估算	120小时
相对估算	64个故事点
基于工作流的估算	利特尔法则 $LT=WIP/Throughput$


- 进度计划

-

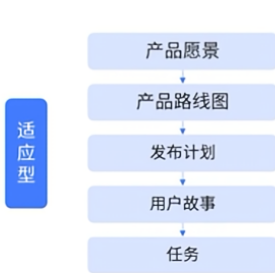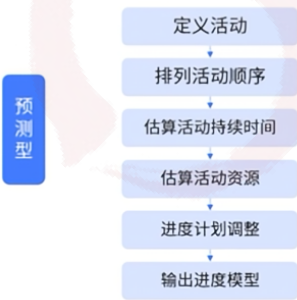

- 预算

-

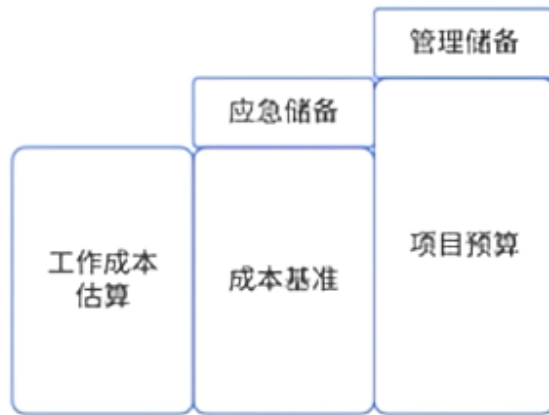

- 项目团队

- 步骤

- 评估团队成员的技能和熟练程度→考虑外部成员的成本和政策→确认同一地点开展工作的必要性

- 概念

- 渗透式沟通


- 通过无意听取和非语言提示，不直接沟通而获得信息的方法

- 虚拟团队

- 在不同地点工作但具有共同目标的人群，通过电话和其他通信方式彼此互助

- 沟通

-

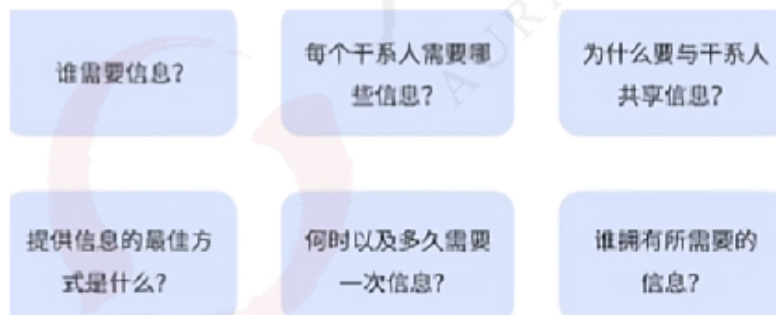

- 实物资源

- 资源类型

- 材料、设备、软件、测试环境、许可证

- 考量因素

- 提前期

- 交付、移动、存储、处置

- 采购

- 自制外购分析


- 影响进度计划

- 变更

- 变更控制流程
- Backlog排序

- 度量值标

-



- 一致性
 - 整合
 - 项目管理计划

- 4.2.5项目工作绩效域

- 成果


-

成果	检查
有效率且有效果的项目绩效	状态报告表明，项目工作有效率且有效果
适合项目和环境的项目过程	审计和质量保证后，证明过程有效
与干系人适当的沟通互动	1. 所有的信息交付给干系人 2. 无特别的信息需求和误解
有效管理实物资源	资源高效利用，废料返工合理
对采购进行有效管理	采购审计表明采购正常开展
有效处理变更	1. 预测，变更日志表明全面评估 2. 适应，Backlog显示完成范围的比例
通过持续学习和过程改进提高能力	团队状态报告，错误返工减少，速度有所提高

- 过程

- 建立过程
 - 使用裁剪技术优化过程
 - 平衡竞争性制约因素
 - 执行工作

-



- 4.2.6交付绩效域

- 成果


-

成果	检查
项目有助于实现商业目标和战略推进	商业计划、战略计划、章程表明，可交付物与商业目标保持一致
项目实现了预期成果	商业论证和基础数据表明可实现成果
在规划的时间区间内实现了收益	财务指标和所规划的交付正按计划实现
项目团队对需求有清楚的认识	1. 预测，初始需求的变化不大 2. 适应，项目顺利进展前不清楚需求
干系人接受并满意成果	1. 访谈、观察、反馈可表明满意度 2. 投诉、退货数量也表明满意度

• 内容

• 价值


•



• 精益画布

- 全面地思考、决策，从系统、商业的角度来规划分析产品，建立全局观
- 商业模式三要素

•



• 需求

• 步骤

- 需求启发
- 需求演变
- 需求记录
- 需求管理

• 范围

• 内容

- 范围分解
 - WBS 用户故事
- 范围验收
 - DOD 验收标准 技术测量指标

- 范围变化
 - 完成偏移 范围领域

- 质量
 - 内容
 - 质量成本
 - 变更成本
 - 次优的成果

• 4.2.7测量绩效域

• 成果

•

成果	检查
对项目状况产生可行的理解	审计测量结果和报告可表明数据的可靠性
有价值的数据能够促进决策	测量结果显示偏差
采取适当的行动，确保项目绩效处于正轨	提前指标和当前状态可导致及时的行动
基于预测进行决策	1. 回顾过去预测确认是否准确反应当前 2. 将实际绩效与计划绩效比较

• 内容

•

有效指标	测量内容	展示信息	测量陷阱	测量故障诊断
提前指标 滞后指标 SMART原则	可交付物 交付 基准绩效 资源 商业价值 干系人 预测	仪表盘 信息发射源 目视管理	霍桑效应 虚荣指标 士气低落 误用度量指标 确认偏见 相关因果关系对比	临界值制定 成长和改进 学习和改进

• 有效指标

• 内容

- 提前指标
 - 可预测项目的变化趋势的指标。
- 滞后指标
 - 可测量项目交付物或事件。
- SMART原则
 -



• 测量内容

• 内容

- 可交付物
- 交付
-

与敏捷的在制品相关联

在制品	半成品数量
提前期	从等待到完成
周期时间	从开始到完成
队列大小	队列中动态的数量
批量大小	一次迭代完成的总数量
过程效率	增值时间除以非增值时间

- 基准绩效
- 资源
 - 资源利用率偏差
 - 实际利用率-计划利用率
 - 资源成本偏差
 - 实际资源成本-计划资源成本
- 商业价值
 - 成本收益比率
 - 收益差
 - 投资回报率
 - 净现值
- 干系人
 - 净推荐值NPS
 - 情绪图

- 士气
- 离职率
- 预测
 - 完工尚需估算ETC
 - 完工估算EAC
 - 完工偏差VAC
 - 完工尚需绩效指数TCPI
 - 回归分析
 - 产量分析

- 展示信息

- 仪表盘
- 信息发射源

- 测量陷阱

-

霍桑效应
虚荣指标
士气低落
误用度量指标
确认偏见
相关因果错误

名称	霍桑效应	虚荣指标	士气低落
含义	测量活动本身会对团队成员的行为产生影响	看起来有用但无法产生有效决策的指标	目标很难达成，士气会因持续未达成而低落
举例	只测量产出，成员只顾产出不顾质量	网站的总访问量不如新客访问量	公司希望自动化能减人70%

- 测量障碍诊断

- 临界值制定
- 成长和改进
 - 测量绩效的目的是改进
 - 团队学习
 - 推动决策
 - 改进产品/绩效
 - 避免问题
 - 防止绩效下降

- 4.2.8不确定性绩效域

- 成果

-

成果	检查
了解项目的运行环境：技术、社会、政治、市场、经济	团队评估风险时考虑了环境因素
积极探索和应对不确定性	风险应对措施和成本、进度等优先级排序一致
了解项目中变量间的依赖性	应对复杂性、模糊波动性的措施适合于项目
能够预测威胁和机会并了解问题的后果	用于识别、捕获和应对风险的系统非常强大
项目交付很少或不会受到不可预见事件的消极影响	满足交付日期、成本偏差在临界值内
利用机会改进项目绩效成果	团队使用既定机制来识别和利用机会
有效利用成本和进度储备，从而与项目目标一致	主动预防威胁，限量使用进度和成本储备

• VUCA

•

概念	定义
不确定性U	缺乏对问题、事件、要遵循的路径或要解决方案的理解或认识
模糊性A	不清晰的状态，难以识别事件的起因，或者有多个从中选择的选项
复杂性C	由于人类行为、系统行为和模糊性而难以管理的项目集、项目或其环境的特征
易变性V	快速且不可预测的变化的可能性
风险	一旦发生，会对一或多个项目目标产生积极或消极影响的不确定事件或条件

• 不确定性

• 普遍不确定性

- 所有项目中必然存在不确定性

• 模糊性

• 概念

- 不清晰的状态，难以识别事件的起因，或多个从中选择的选项

• 类别

- 概念模糊
- 情境模糊

• 解决方案

- 渐进明细
- 实验
- 原型法

• 复杂性

- 由于人类行为，系统行为和模糊性而难以管理的项目特征

• 易变性

• 概念

- 可能会快速且不可预测的变化的环境中

• 应对措施

- 备选方案分析
- 储备
