


第03章 人




第03章 人

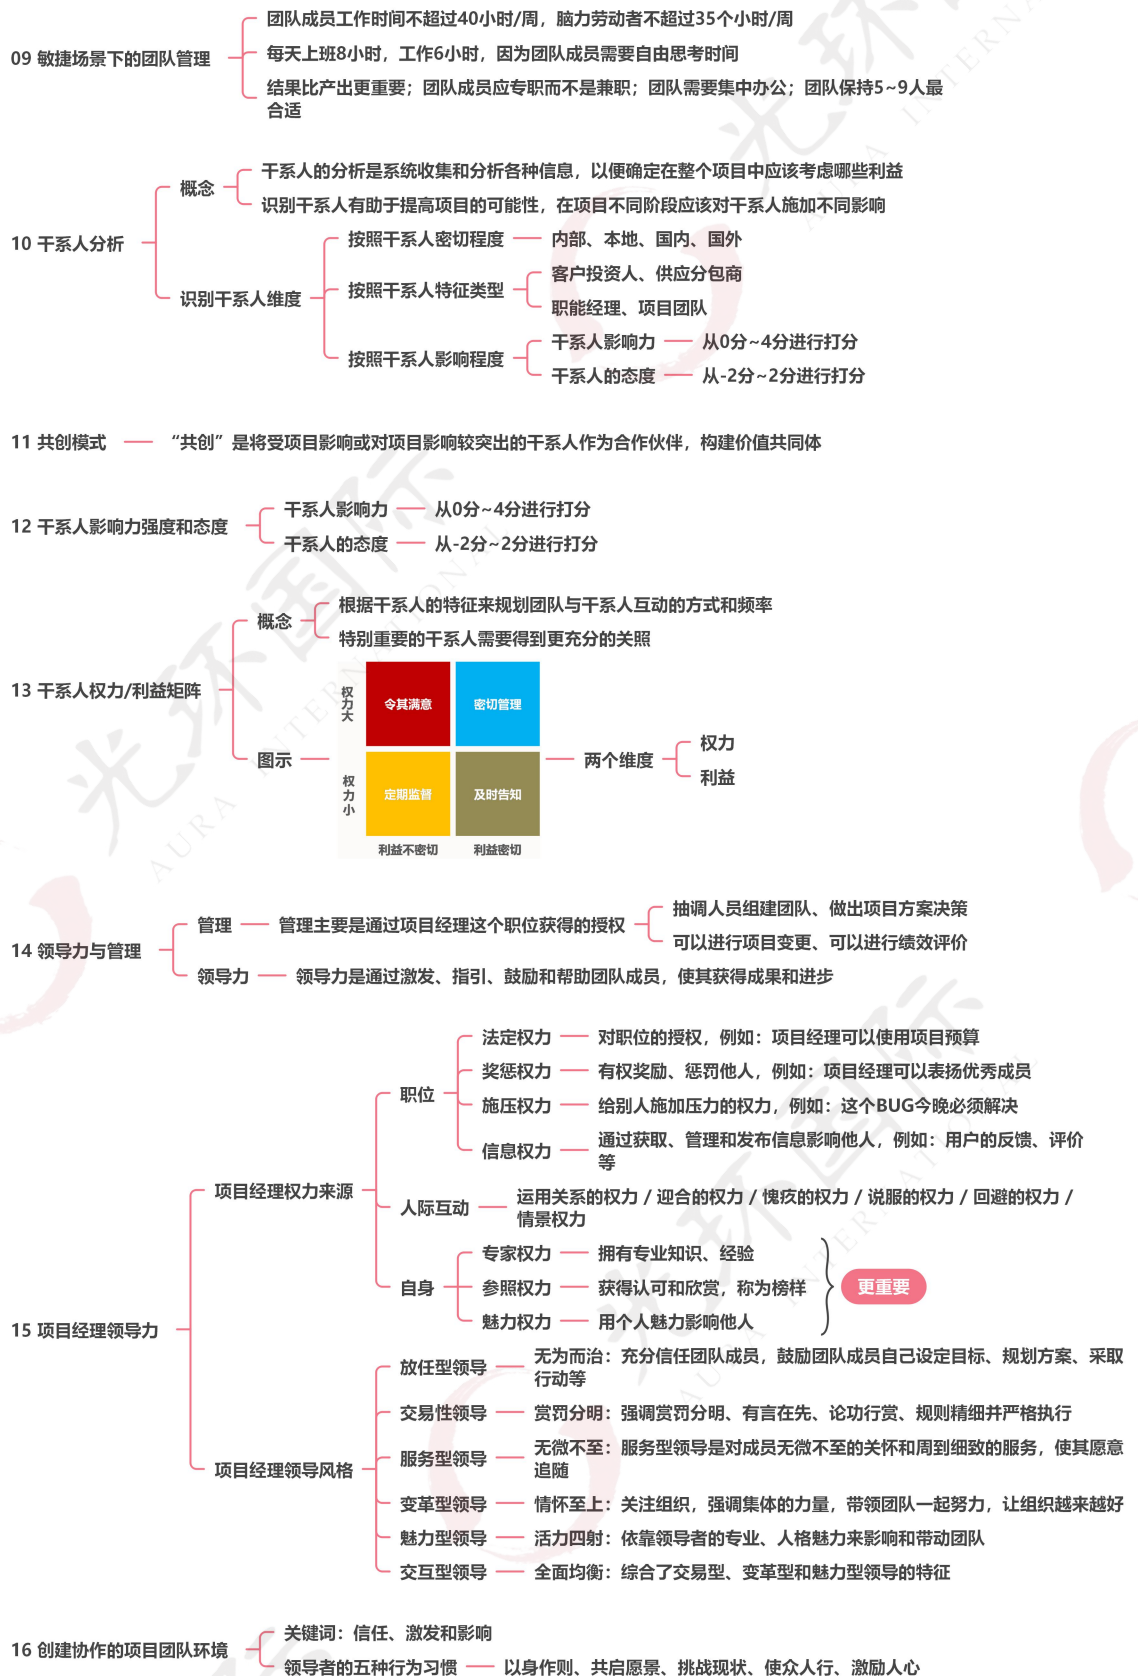

第03章 人

- 17 展现领导力行为
- 1、诚实
 - 2、有胜任力 — 邓宁—克鲁格心理效应
 - 3、能激发别人
 - 4、有前瞻性
 - 1、扎实的知识积累
 - 2、关注细节的习惯
 - 3、相信专家的力量

- 18 定义团队的基本规则 — 团队章程 — 团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南、团队共识



18 塔克曼阶梯理论

图示

- 说明
- 形成阶段 — 团队成员相互认识，并了解项目情况及他们在项目中的正式角色与职责。在这一阶段，团队成员倾向于相互独立，不一定开诚布公。
 - 震荡阶段 — 团队开始从事项目工作、制定技术决策和讨论项目管理方法。团队成员若不能用合作和开放的态度对待不同观点，团队环境可能变得事与愿违。
 - 规范阶段 — 团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队。团队成员会学习相互信任。
 - 表现阶段 — 团队就像一个组织有序的单位那样工作，团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。
 - 遣散阶段 — 团队完成所有工作，团队成员离开项目。
- 规律
- 倒退：团队可能存在停止在某个阶段或退回到较早阶段的情况。
 - 跳跃：如果团队成员共事过，项目团队建设可以跳过某个阶段。
- 指标 — 团队士气与工作绩效

19 项目经理管理风格

不同发展阶段的领导风格

- 形成阶段 — 指令型：直接、明确、清晰
- 震荡阶段 — 影响型：引导、斡旋、调解
- 规范阶段 — 参与型：帮助、参与、促进
- 表现阶段 — 授权型：信任、授权、支持

20 领导团队

领导团队的几个基本任务

- 1、设置清晰的愿景和使命
- 2、支持多样性和包容性
- 3、促进团队成长

21-23 冲突管理

主要观点

- 冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等。
- 良性冲突指的是“对事不对人”，冲突仍然聚焦在解决问题的思路和方法的争论上。
- 成功的冲突可以提高生产力和改进工作关系，有利于提高创造力和改进决策。

解决方法

- 撤退/回避 — 从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，是一种临时解决冲突的方法。
- 缓和/包容 — 淡化双方分歧，注意双方意见一致的地方，求同存异或牺牲自己利益满足对方以保持和睦关系。
- 妥协/协调 — 双方通过沟通均作出让步，使各方诉求能够得到一定程度的满足，暂时或部分解决冲突。
- 强迫/命令 — 以牺牲一方为代价，强制推行另一方观点，这种方法在解决紧急问题时是必要的。
- 合作/解决 — 以合作的态度积极对话，寻求可以满足双方诉求的方法，这是双赢的结果。

图示



第03章 人

- 24 凝聚共识
- 分析产生误解的原因
 - 引导各方达成都能接受的目标
 - 创造必要的仪式感 —— 启动会与开工会、里程碑与例会、任命与授权、各种庆祝活动等等

- 25 虚拟团队与实体团队
- 虚拟团队优势
 - 1、打破了地域对人才的局限
 - 2、降低了差旅、通勤、场地等成本
 - 3、对于兼职人员和零工的使用更加灵活
 - 虚拟团队劣势
 - 1、沟通效率低，效果差
 - 2、管理难度大，标准难统一
 - 3、团队难建立信任感，问题容易积累
 - 虚拟团队的参与方案 —— 清晰的规则、标准的流程、具体的任务、合适的工具、民主的机制、积极的互动、充足的准备、及时的复盘

- 26 运用情商提升团队绩效
- 情商的四个指标
 - 感知他人情感的能力
 - 掌控自我情感的能力
 - 关注他人情感的意愿
 - 影响他人情感的能力
 - 如何运用情商提升团队绩效 —— 尊重差异、面向体验

- 27 支持团队绩效
- 如何达到好的绩效
 - 参与与反馈
 - 解决和消除团队面临的障碍
 - 向团队成员和干系人授权

- 责任分配矩阵 —— RACI
- RAM的一个例子是 RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵
 - RACI矩阵往往表示活动和每个具体团队成员之间的关系

RACI 矩阵	人员				
	安	本	卡洛斯	迪娜	艾德
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R

R = 负责 A = 问责 C = 咨询 I = 通知

- 28 确保团队成员和干系人接受适当的培训

管理者	培训责任	例子
人力资源经理	公司章程、流程、制度	年假怎么请，向谁请
资源经理*	业务、技术能力	自动化测试脚本如何开发
项目经理	项目管理知识、工具、方法	关键路径如何识别

- 29 与干系人协作
- 干系人登记册
 - 概念 —— 干系人登记册是识别干系人过程的主要输出。它记录关于已识别干系人的信息
 - 内容
 - 基本信息 —— 姓名、职位、项目角色、地址、联系方式
 - 评估信息 —— 主要需求、主要期望、对项目的潜在影响等

编号	干系人	影响力	态度	影响阶段	需求
1	客户总经理	4	2	I, C	按期交付、不超预算
2	客户财务经理	3	-1	P, E, C	越简越好、最好不做
3	分包商项目经理	2	1	E, C	少提变更、及时结款
.....					

影响力（权力/Power）：无(0)、弱(1)、中(2)、强(3)、极强(4)；
态度（利益/Interest）：抵制(-2)、反对(-1)、中立(0)、支持(1)、推动(2)；
影响阶段：I 启动，P 规划，E 执行，C 收尾；（可多选）


- 干系人参与评估矩阵

- 30 谈判确定项目协议
- 1、通过谈判对项目目标达成共识
 - 2、开诚布公地面对分歧

第03章 人

- 31 干系人影响方向
- 概念 — 根据干系人对项目工作或项目团队本身的影响方向，对干系人进行分类
 - 类型
 - 向上 — 执行组织或客户组织、发起人和指导委员会的高级管理层
 - 向下 — 团队成员、临时贡献知识或技能的团队或专家
 - 向外 — 项目团队外的干系人群体及其代表，如供应商、最终用户和监管部门
 - 横向 — 项目经理的同级人员，如其他项目经理或中层管理人员

- 32 情境影响力
- 提出人 — 美国行为学家保罗·赫塞博士在他所著的《情境领导者》一书中提出的
 - 观点
 - 1、领导者应随组织环境和个体变换而改变领导风格和管理方式
 - 2、领导者要同时扮演管理者与领导者两种角色。他首先是一个领导者，其次才是管理者
 - 3、领导者的行为要与被领导者的准备度相适应，如此才能取得好的成果
 - 4、针对被领导者不同的准备度水平，可以采取四种不同的领导方式
 - 5、领导力就是执行力

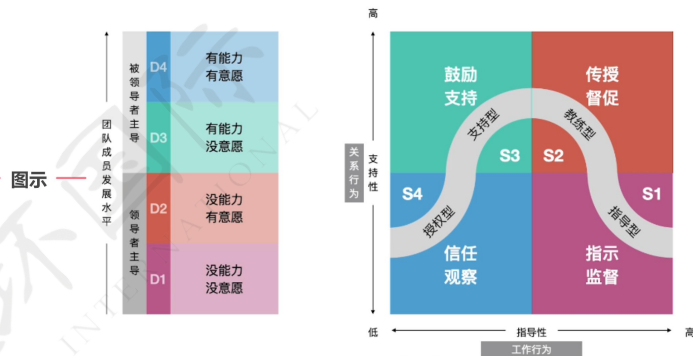

- 33 干系人和领导力评估
- 概念 — 用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较
 - 干系人参与度
 - 不知晓 — 不知道项目及其潜在影响
 - 抵制 — 知道项目及其潜在影响，抵制变革
 - 中立 — 了解项目，但既不支持，也不反对
 - 支持 — 了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果
 - 领导 — 了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功
 - 图示

相关方	不知晓	抵制	中立	支持型	领导
相关方 1	C			D	
相关方 2			C	D	
相关方 3				D C	
 - 说明
 - C 代表每个干系人的当前参与水平
 - D 代表项目成功所需要的参与度
 - 干系人满意度评估 — 交付成果、需求响应、工作效率、专业程度、冲突处理、沟通协作
 - 领导力评估 — 建立信任、积极聆听、开启愿景、激发动力、启发创造、促进行动、管理进步、表达欣赏

- 34 团队绩效评价和团队成长评估
- 团队绩效评价
 - 随着项目团队建设工作的开展，项目管理团队应该对项目团队的有效性进行评价
 - 评价团队有效性指标
 - 个人技能的改进：团队成员能够更有效地完成工作任务
 - 团队整体能力的改进：团队成员配合更默契，效率更高
 - 团队成员离职率降低：团队士气得到提升
 - 团队凝聚力增强：例如，成员主动分享信息与经验、互相帮助

	团队绩效评级	项目绩效评价
对象	人：项目团队	事：项目进度、成本等指标
标准	团队有效性	计划吻合度
过程组	执行过程组	监控过程组
方法	回顾会议	挣值分析
